Porteinerstrasse Abzw. Sarn -Postplatz
Bauprogramm 2026
Programm-Nummer

Gesamtdauer
Etappe

Schreiner	Sanitär	Belag	Feiertage
ALW Gde. Cazis	Baugeologe	Geometer	Kompensation
Baumeister	Betriebsferien BU	Verkehr	Weiterbildung

Baubeginn: 23.03.2026

Aktivität	Dauer	Anfang	Ende
Baustelleninstallation			
Installationplatz erstellen	**5**	**23.03.2026**	**27.03.2026**
Bavurtga QP 1- 83:	**35**	**27.03.2026**	**20.05.2026**
Strassensperrung QP 1- 83		23.03.2026	20.05.2026
Rückbau Belag und Sondagen für WV-Prov. P85 und P33	**2**	**26.03.2026**	**27.03.2026**
Provisorien WV durch Sanitär	**3**	**26.03.2026**	**30.03.2026**
Trasseaushub	**5**	**31.03.2026**	**08.04.2026**
Fundation ausbauen, Unterfangen/Vorbetonieren, Entwäesserung prov.	5	31.03.2026	08.04.2026
Werkleitungen	**26**	**09.04.2026**	**13.05.2026**
Grabenaushub inkl. Wasserhaltung	6	09.04.2026	16.04.2026
Rohrverlegung WV durch Sanitär	4	16.04.2026	24.04.2026
Rohrverlegung SAW u. RAW inkl. Schächte	6	17.04.2026	24.04.2026
Anschlüsse / Einläufe / Hausanschlüsse	4	27.04.2026	30.04.2026
Rohrverlegung KSR	3	01.05.2026	05.05.2026
Rohrumhüllung bis Planum	4	06.05.2026	11.05.2026
Trassebau	**5**	**12.05.2026**	**20.05.2026**
Planum erstellen, Plattendruckversuch (ME gemäss BB2)	2	12.05.2026	13.05.2026
Fundation schichtweise	3	18.05.2026	20.05.2026
Fundation Plattendruckversuch ME >80 MN/m2		20.05.2026	20.05.2026
Bavurtga am 18.05.2026 um 06:00 für Bauer befahrbar		18.05.2026	18.05.2026
Kanal TV-Aufnahme aufbieten/ausführen		20.05.2026	20.05.2026
Teilausmass an BL liefern		29.05.2026	29.05.2026
Belag Bavurtga	**9**	**18.05.2026**	**29.05.2026**
Planie, Randabschlüsse, Tragdeckschicht	9	18.05.2026	29.05.2026
Porteinerstrasse QP 1 - 130:	**15**	**20.05.2026**	**11.06.2026**
Strassensperrung QP 1 - 130		20.05.2026	11.06.2026
Rückbau Belag	**2**	**20.05.2026**	**21.05.2026**
Trasseaushub	**3**	**22.05.2026**	**27.05.2026**
Fundation ausbauen, Unterfangen/Vorbetonieren, Entwäesserung prov.	3	22.05.2026	27.05.2026
Bavurtga am 26.05.2026 um 06:00 für Bauer befahrbar		26.05.2026	26.05.2026
Werkleitungen	**9**	**28.05.2026**	**09.06.2026**
Grabenaushub inkl. Wasserhaltung	2	28.05.2026	29.05.2026
Bavurtga am 1.06.2026 um 06:00 für Bauer befahrbar		01.06.2026	01.06.2026
Rohrverlegung Sickerltg. inkl. Schächte	2	01.06.2026	02.06.2026
Anschlüsse / Einläufe / Hausanschlüsse	1	02.06.2026	02.06.2026
Rohrverlegung KSR	1	03.06.2026	03.06.2026
Rohrumhüllung bis Planum	2	03.06.2026	04.06.2026
Trassebau	**3**	**05.06.2026**	**11.06.2026**
Planum erstellen, Plattendruckversuch (ME gemäss BB2)	2	05.06.2026	08.06.2026
Fundation schichtweise	3	08.06.2026	11.06.2026
Fundation Plattendruckversuch ME >100 MN/m2		11.06.2026	11.06.2026
Teilausmass an BL liefern (BU)		19.06.2026	19.06.2026
Porteinerstrasse QP 130 - 200:	**15**	**12.06.2026**	**02.07.2026**
Strassensperrung QP 130 - 148		12.06.2026	19.06.2026
Strassensperrung QP 148 - 200		19.06.2026	02.07.2026
Rückbau Belag	**2**	**12.06.2026**	**12.06.2026**
Provisorien WV durch Sanitär	**1**	**12.06.2026**	**12.06.2026**
Trasseaushub	**6**	**15.06.2026**	**20.06.2026**
Fundation ausbauen, Unterfangen/Vorbetonieren, Entwäesserung prov.	6	15.06.2026	20.06.2026
Werkleitungen	**7**	**22.06.2026**	**30.06.2026**
Grabenaushub inkl. Wasserhaltung	2	22.06.2026	23.06.2026
Rohrverlegung WV durch Sanitär	2	23.06.2026	24.06.2026
Rohrverlegung SAW u. RAW inkl. Schächte	3	24.06.2026	26.06.2026
Anschlüsse / Einläufe / Hausanschlüsse	1	29.06.2026	29.06.2026
Rohrverlegung KSR	1	29.06.2026	29.06.2026
Rohrumhüllung bis Planum	1	30.06.2026	30.06.2026
Trassebau	**3**	**01.07.2026**	**03.07.2026**
Planum erstellen, Plattendruckversuch (ME gemäss BB2)	1	01.07.2026	01.07.2026
Fundation schichtweise	2	02.07.2026	03.07.2026
Fundation Plattendruckversuch ME >100 MN/m2		02.07.2026	02.07.2026
Kanal TV-Aufnahme aufbieten/ausführen		03.07.2026	03.07.2026
Teilausmass an BL liefern (BU)		10.07.2026	10.07.2026
Teilausmass an BL liefern (SAN)		10.07.2026	10.07.2026
Porteinerstrasse QP 200-280:	**18**	**02.07.2026**	**24.07.2026**
Strassensperrung QP 200-280		02.07.2026	24.07.2026
Rückbau Belag	**2**	**02.07.2026**	**06.07.2026**

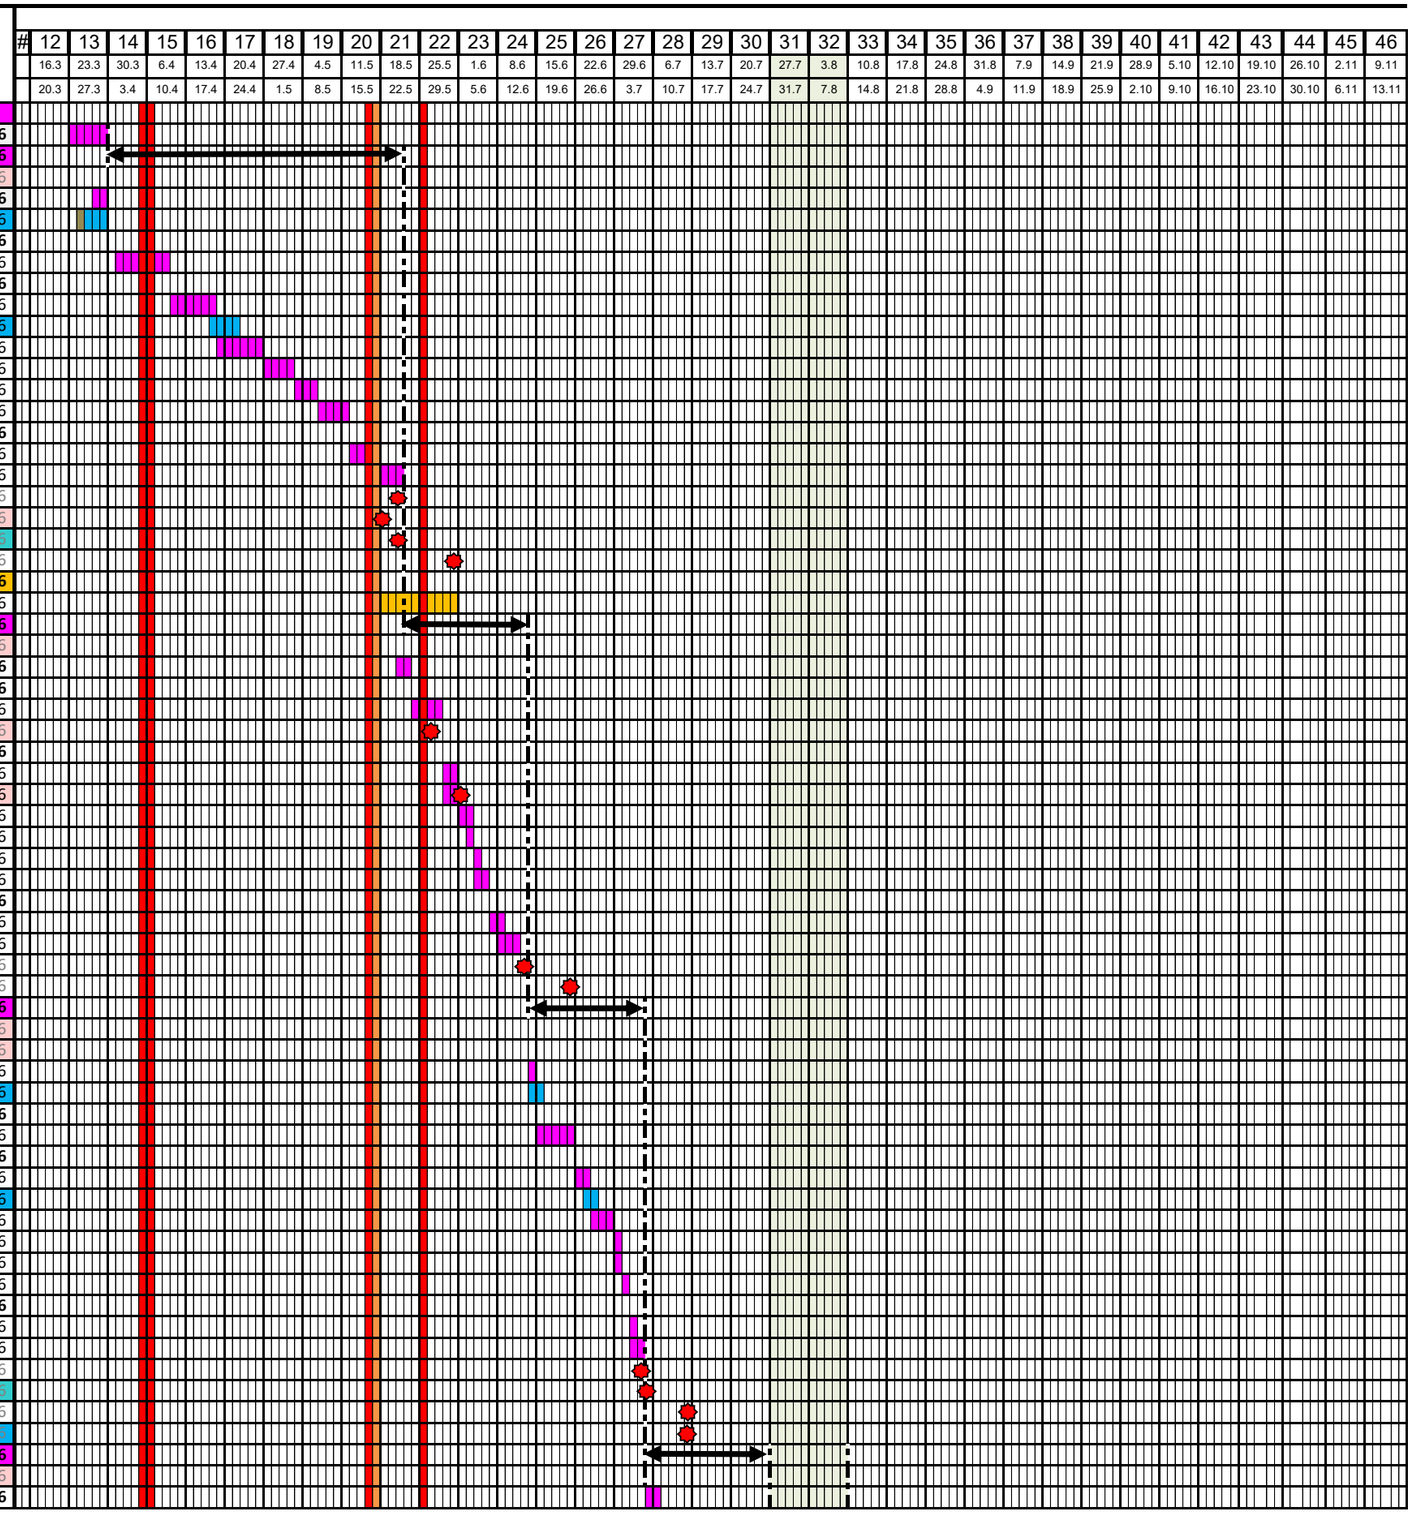
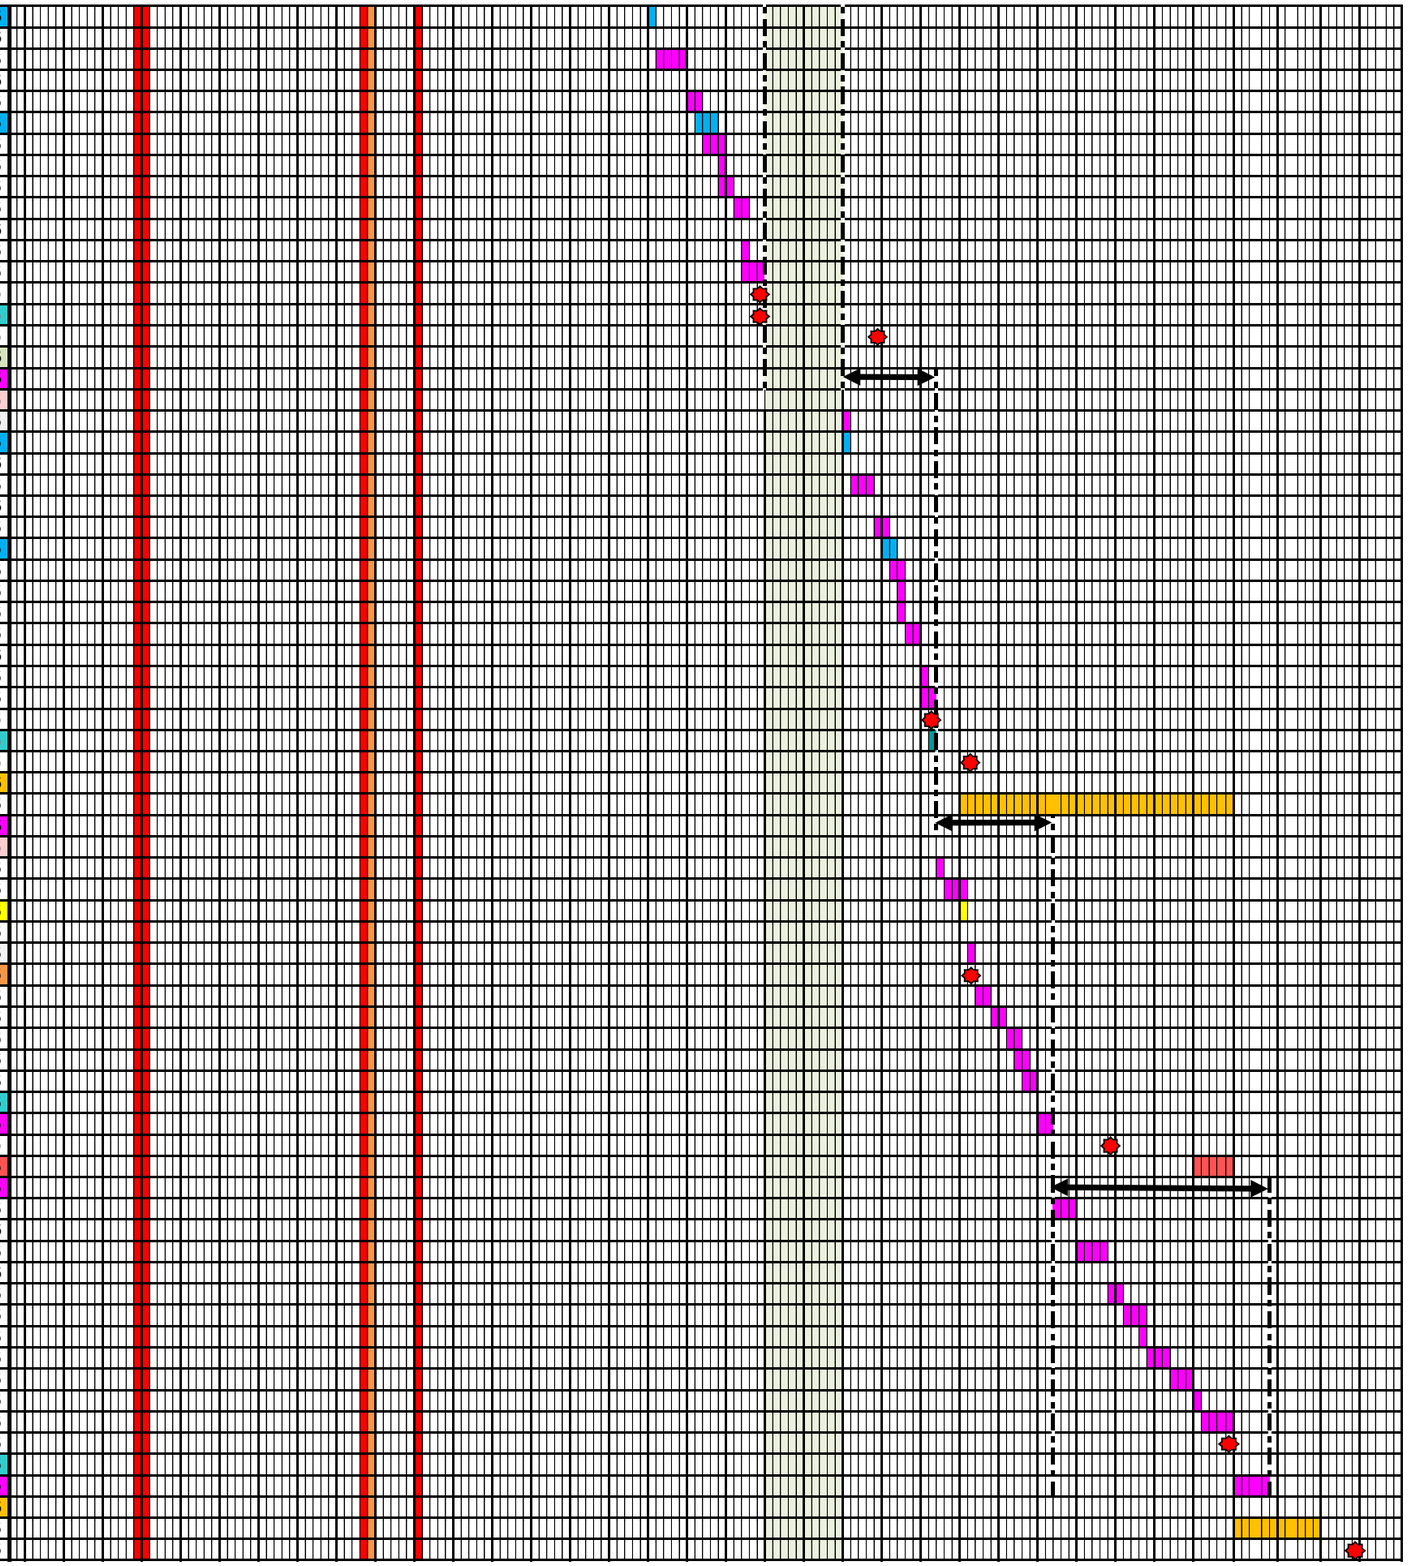
Provisorien WV durch Sanitär	**1**	**06.07.2026**	**06.07.2026**
Trasseaushub	**5**	**07.07.2026**	**11.07.2026**
Fundation ausbauen, Unterfangen/Vorbetonieren, Entwäesserung prov.	5	07.07.2026	11.07.2026
Werkleitungen	**8**	**13.07.2026**	**22.07.2026**
Grabenaushub inkl. Wasserhaltung	2	13.07.2026	14.07.2026
Rohrverlegung WV durch Sanitär	3	14.07.2026	16.07.2026
Rohrverlegung SAW u. RAW inkl. Schächte	3	15.07.2026	17.07.2026
Anschlüsse / Einläufe / Hausanschlüsse	1	17.07.2026	17.07.2026
Rohrverlegung KSR	2	17.07.2026	20.07.2026
Rohrumhüllung bis Planum	2	21.07.2026	22.07.2016
Trassebau	**3**	**22.07.2026**	**24.07.2026**
Planum erstellen, Plattendruckversuch (ME gemäss BB2)	1	22.07.2026	22.07.2026
Fundation schichtweise	3	22.07.2026	24.07.2026
Fundation Plattendruckversuch ME>100 MN/m2		24.07.2026	24.07.2026
Kanal TV-Aufnahme aufbieten/ausführen		24.07.2026	24.07.2026
Teilausmass an BL liefern		14.08.2026	14.08.2026
Betriebsferien BU	**14**	**27.07.2026**	**09.08.2026**
Postplatz:	**12**	**10.08.2026**	**25.08.2026**
Strassensperrung Postplatz		10.08.2026	25.08.2026
Rückbau Belag	1	10.08.2026	10.08.2026
Provisorien WV durch Sanitär	1	10.08.2026	10.08.2026
Trasseaushub	**3**	**11.08.2026**	**13.08.2026**
Fundation ausbauen, Unterfangen/Vorbetonieren, Entwäesserung prov.	3	11.08.2026	13.08.2026
Werkleitungen	**4**	**14.08.2026**	**21.08.2026**
Grabenaushub inkl. Wasserhaltung	2	14.08.2026	17.08.2026
Rohrverlegung WV durch Sanitär	2	17.08.2026	18.08.2026
Rohrverlegung SAW u. RAW inkl. Schächte	2	18.08.2026	19.08.2026
Anschlüsse / Einläufe / Hausanschlüsse	1	19.08.2026	19.08.2026
Rohrverlegung KSR	1	19.08.2026	19.08.2026
Rohrumhüllung bis Planum	2	20.08.2026	21.08.2026
Trassebau	**2**	**24.08.2026**	**25.08.2026**
Planum erstellen, Plattendruckversuch (ME gemäss BB2)	1	24.08.2026	24.08.2026
Fundation schichtweise	2	24.08.2026	25.08.2026
Fundation Plattendruckversuch ME>100 MN/m2		25.08.2026	25.08.2026
Kanal TV-Aufnahme aufbieten/ausführen		25.08.2026	25.08.2026
Teilausmass an BL liefern		01.09.2026	01.09.2026
Belag Porteinerstrasse und Postplatz	**35**	**31.08.2026**	**16.10.2026**
Planie, Randabschlüsse, Tragdeckschicht	9	19.10.2026	30.10.2026
Trafostation:	**15**	**26.08.2027**	**15.09.2026**
Strassensperrung Kirchaweg und PP		26.08.2026	16.10.2026
Abbruch Mauer und evtl. Treppe	1	26.08.2026	26.08.2026
Aushub	3	27.08.2026	31.08.2026
Baugrunduntersuchung Böschungsneigung durch Geo-Bau-Labor AG	1	31.08.2026	31.08.2026
Ortsbetonbau	7	01.09.2026	09.09.2026
Magebetonsohle	1	01.09.2026	01.09.2026
Absteckungsabnahme Schnürgerüst durch GF	1	01.09.2026	01.09.2026
Bodenplatte Schalung, Bewehrung, Betonieren	2	02.09.2026	03.09.2026
Wände Schalung, Bewehrung, Betonieren	2	04.09.2026	07.09.2026
Decke Schalung, Bewehrung, Betonieren	2	08.09.2026	09.09.2026
Hinterfüllung	1	09.09.2026	10.09.2026
Werkleitungen	1	10.09.2026	11.09.2026
Kanal TV-Aufnahme aufbieten/ausführen		11.09.2026	11.09.2026
Fertigstellungsarbeiten	2	14.09.2026	15.09.2026
Ausmass Trafo an BL liefern		25.09.2026	25.09.2026
Holzfassade		12.10.2026	16.10.2026
Kirchaweg QP 1 -54:	27	16.09.2026	16.10.2026
Rückbau Belag	3	16.09.2026	18.09.2026
Trasseaushub	**4**	**21.09.2026**	**24.09.2026**
Fundation ausbauen, Unterfangen/Vorbetonieren, Entwäesserung prov.	4	21.09.2026	24.09.2026
Werkleitungen	**11**	**25.09.2026**	**09.10.2026**
Grabenaushub inkl. Wasserhaltung	2	25.09.2026	28.09.2026
Rohrverlegung SAW u. RAW inkl. Schächte	3	29.09.2026	01.10.2026
Anschlüsse / Einläufe / Hausanschlüsse	1	01.10.2026	01.10.2026
Rohrverlegung KSR inkl Schacht setzen Parz. 7585	3	02.10.2026	06.10.2026
Rohrumhüllung bis Planum	3	07.10.2026	09.10.2026
Planum erstellen, Plattendruckversuch (ME gemäss BB2)	1	12.10.2026	12.10.2026
Fundation schichtweise	3	13.10.2026	15.10.2026
Fundation Plattendruckversuch ME>80 MN/m2		16.10.2026	16.10.2026
Kanal TV-Aufnahme aufbieten/ausführen		16.10.2026	16.10.2026
Fertigstellungsarbeiten		19.10.2026	22.10.2026
Belag Kirchaweg und PP	**10**	**19.10.2026**	**30.10.2026**
Planie, Randabschlüsse, Tragdeckschicht	9	19.10.2026	30.10.2026
Schlussausmasse an BL liefern (Alle)		06.11.2026	06.11.2026
